

Projektbegleitender Ausschuss

3. Sitzung

28.07.2010

**Projekt TENIVER –
Technologische Innovation in
der Informationsversorgung**

3. Tätigkeitsbericht

Berichtszeitraum: April – Juni 2010

Berichtersteller: Andres Imhof



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Inhalt

1. Arbeitsschritte und Aktivitäten
2. Publizitätsmaßnahmen
3. Indikatoren / Kostenplan
4. Sonstiges
5. Ausblick

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Projektgremien

- **LPT: Lokale Projektteams**
 - 13 lokale Projektteams bei den VÖBB-Teilnehmern:
durchschnittlich 4,3 Treffen der lokalen Projektteams
- **ZSG: Zentrales Steuerungsgremium**
 - 3 Sitzungen

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Projektgremien

- **Gemeinsame Projektteams: 8 Arbeitstreffen**
 - GPT 1 (Konvertierung): Aufträge abgeschlossen, ruht z.Z.
 - GPT 2 (Benutzung): Benutzungsführung am Selbstverbucher etc., mögliche Sortierkriterien, Vorbereitung Informationsmaterialien RFID, Erstellung eines Benutzungshandbuchs
 - GPT 3 (Technik): Entwicklung von Abnahme-Checklisten vorläufig abgeschlossen, ruht z.Z.
 - GPT 4 (Innovation): ruht z.Z.
 - GPT 5 (Organisationsentwicklung): Auftrag zur Erstellung einer Muster-BAK abgeschlossen, ruht z.Z.

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Bezirksplanungen

- Individuelle Gespräche pro Bezirk zu Geräteausstattung, optionale Geräte, Installationen und Zeitplanung pro Standort: 2 Arbeitstreffen
 - ZLB
 - Bezirk Mitte

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Techn. Ausschreibung

- Mündliche Verhandlung des gegnerischen Einspruchs bei der Vergabekammer: 13. Apr. 2010
- Beschluss der Vergabekammer: Zurückweisung der gegnerischen Anträge am 26. Apr. 2010
- Sofortige Beschwerde des unterlegenen Gegners gegen den Beschluss bei Kammergericht: 12. Mai 2010
- Erwidierungen auf die gegnerischen Anträge:
 - Zum Eilantrag (keine Zuschlagserteilung vor Ende des Verfahrens): 25. Mai 2010
 - Zu den Hauptanträgen (Rücksetzung des Verfahrens, hilfsweise Aufhebung): 1. Juni 2010

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Verpackungsausschreibung

- Angebotsfrist: 6. Apr. 2010
- 3 Sitzungstage des Auswahlgremiums (7 Mitglieder: Zentrales Projektteam, Bezirksvertreterinnen), 12. bis 15. Apr. 2010
- Zuschlagserteilung: 27. Apr. 2010
 - Lieferfirma für beide Lose: NORIS Transportverpackungen, Nürnberg
- 1. und 2. Lieferung in 10 Bezirke: Mai und Juni 2010
- Beginn des Umverpackens von AV-Medien und Medienkombinationen in den Bezirken

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Schulungen

- Schulungen „Veränderungsmanagement“:
 - Partner: Verwaltungsakademie; nicht über Projekt finanziert
 - Kick-Off für alle Bezirke (BZB-Leiter_innen, LUV-Leitungen, Leitung ZLB): 13. Apr. 2010
 - Zweitägige Schulungen für die mittlere Leitungsebene: 9 Schulungen, 22. Apr. - 29. Jun. 2010; Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln, Pankow, ZLB)
 - Eintägige Schulungen für Mitarbeiter_innen ohne Leitungsfunktion: 6 Schulungen, 4. - 30. Jun. 2010; Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg
 - Fazit: sehr positive Rückmeldungen der Teilnehmer_innen

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Qualitätsmanagement


- Checklisten (GPT 3):
 - für die Abnahme von RFID-Etiketten
 - für die Abnahme von RFID-Arbeitsplätzen
- Technische Ausschreibung:
 - Juristische Vertretung durch Rechtsanwaltskanzlei

Publizitätsmaßnahmen: regelmäßige Publikationen

- Projektwebseite: intern und öffentlich
<http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/themen/rfid/projekte/voebb>
- **Monatlicher Projekt-Newsletter für alle VÖBB-Teilnehmer: 3 Ausgaben im zweiten Quartal 2010**
- **TENIVER auf www.voebb.de**
- **Mailadresse rfid-im-voebb@zlb.de für Anfragen von Nutzer_innen**

Publizitätsmaßnahmen: Zugriffsstatistik

Bibliotheksportal: Seitenaufrufe TENIVER

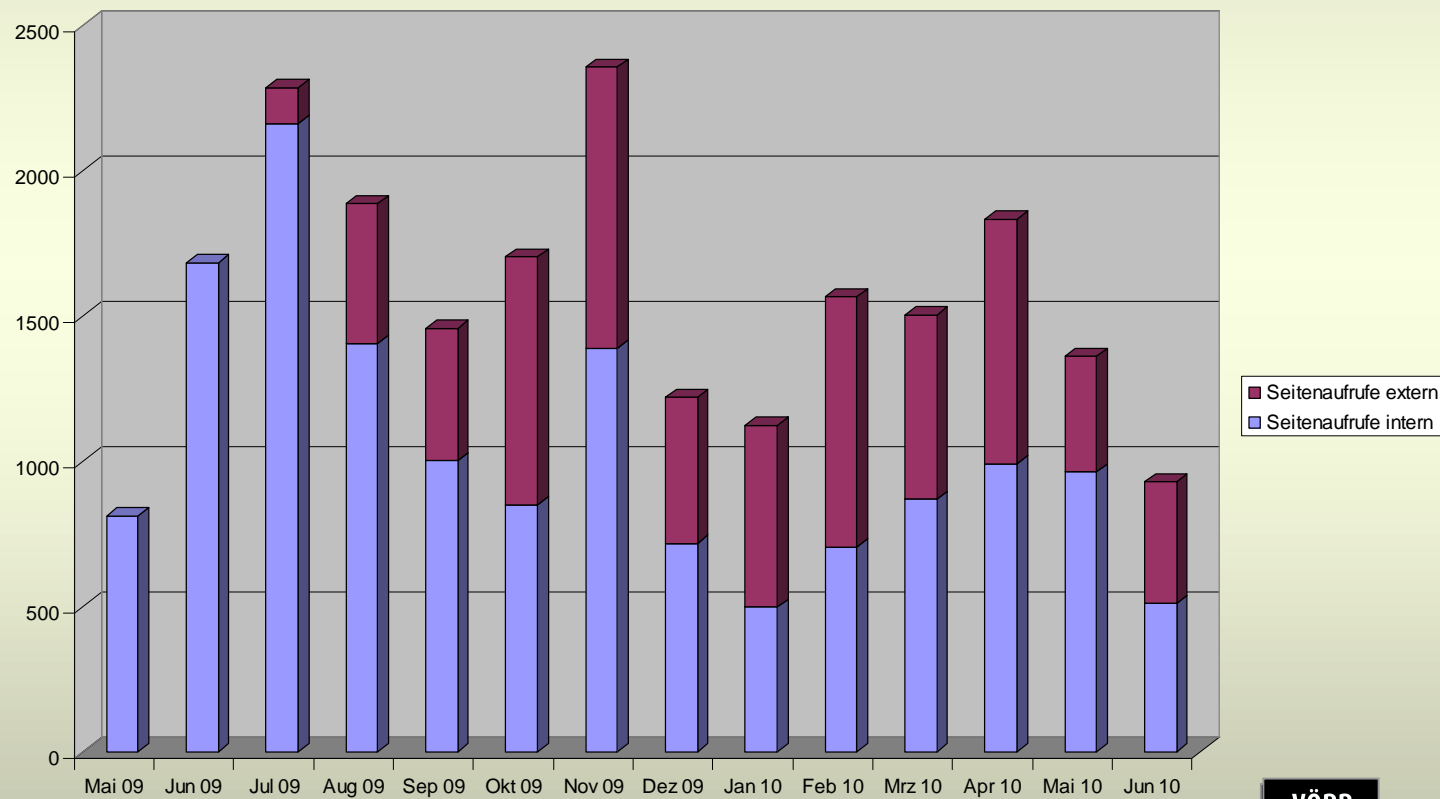

Publizitätsmaßnahmen: Sonstige

- **Informationen für Gremien der Berliner Öffentlichen Bibliotheken: FAK Fahrbibliotheken, StäKo, Verbundkonferenz**
- **Informationen für Mitarbeiter_innen der Berliner Öffentlichen Bibliotheken: Bezirk Pankow**
- **Mitarbeit in der AG RFID des dbv am 19. April**
 - Die Teilnahme an der Sitzung am 19.04.2010 musste leider wegen Eyjafjallajökull „anulliert“ werden
- **Gespräch mit SenKult am 23. April 2010**

Indikatoren

- Indikatoren sind derzeit noch nicht zu ermitteln, da sich alle auf Zeiten nach RFID-Kick-Off beziehen
- 2. Änderungsantrag am 4. Juni 2010:
 - Verschiebung von nicht zu verausgabenden Mitteln von 2010 auf 2011
 - Einrichtung neuer Kostenstellen:
 - Software, RFID-Leseausweis, Projektplanung Anbieter
 - Zusammenführung von Kostenstellen:
 - „PA Verbuchung“ und „PA Büro“ zu „PA“
 - Neuantrag für RFID-Leseausweise, Technische Schulungen sowie Schulungen zur Heranführung der Kunden an die Technik

Indikatoren

- Abweichungen vom Zeitplan:
 - Unterbrechung der Zuschlagserteilung durch das Kammergericht

Sonstiges

- Hindernisse und Probleme:
 - Weitere Verschiebung der Zuschlagserteilung verursacht u.a. Zusatzkosten in Friedrichshain-Kreuzberg
 - Finanzplanung kann nicht ohne Zuschlagserteilung erfolgen
 - Ausstehende Antwort auf den 2. Änderungsantrag verzögert ebenfalls Finanzplanung
 - Interne Reibungsverluste:
 - Verspätete Unterschrift unter die Verwaltungsvereinbarung aus Pankow
 - Verspätete Überweisung des Eigenanteils aus Steglitz-Zehlendorf
 - Fazit: In manchen Bezirken fehlt der Wille, das Ziel gemeinsam erreichen zu wollen
 - Positiv: engagierte Unterstützung durch andere Bezirke wie Tempelhof-Schöneberg, Mitte, Spandau ...

Ausblick

- Fortführung der Einzelgespräche mit Bezirken zur lokalen Planung
- Nach Antwort auf 2. Änderungsantrag:
 - Beauftragung des Konfliktmanagements
- Fortgang der Projektumsetzung:
 - Umverpackung von Non-Book-Medien
 - Vorbereitung aller Medien (Makulieren, Eintrag besitzende Bibliothek)
 - Konvertierung in einigen Bezirken
