

**Projektbegleitender Ausschuss
5. Sitzung
09.03.2011**

**Projekt TENIVER –
Technologische Innovation in
der Informationsversorgung**



5. Tätigkeitsbericht
Berichtszeitraum: Oktober 2010 – Februar 2011
Berichterstatteerin: Beate Herbst



www.voebb.de
Wir bringen Medien in Bewegung

Inhalt

- 1. Arbeitsschritte und Aktivitäten**
- 2. Publizitätsmaßnahmen**
- 3. Indikatoren / Kostenplan**
- 4. Sonstiges**
- 5. Ausblick**



www.voebb.de
Wir bringen Medien in Bewegung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Personal

- Es fand ein Wechsel in der Projektleitung zum 01. November 2010 statt. Herr Imhof verließ das Projekt aus persönlichen Gründen.
- Die neue Projektleitung nimmt seit dem 1. November 2011 Frau Herbst wahr. Sie war vorher als Koordinatorin des Verfahrens VÖBB tätig.
- Die stellvertretende Projektleiterin Frau Frank verlässt Ende des Jahres das Projektteam. Frau Lamprecht übernimmt die Stelle ab dem 01.01.2011 mit 50% ihrer Arbeitszeit.



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Projektgremien

- **ZSG: Zentrales Steuerungsgremium**
 - 5 Sitzungen
- **Verbundkonferenz:**
 - 1 Sitzung
 - neue Personalstruktur des zentralen Projektteams
 - Verhandlungsverfahren



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Projektgremien

- **Gemeinsame Projektteams:**
 - **1 Arbeitstreffen : GPT 1 (Bekleben) und GPT 3 (Technik) zur Gründung von zwei UAGs:**
 - **Überarbeiten des Musterkatalogs und des Konvertierungsleitfadens sowie der Abnahmechecklisten für einen RFID-Dienstleistungsarbeitsplatz und die Checkliste für den Etikettentest**
 - **5 Arbeitstreffen von UAG: Bücher/Medienpakete und UAG: AV-Medien**
 - **Prüfung und Praxis-Testung von Proximity-Readern und geschirmten Antennen sowie StingRay-Etiketten in den Bezirken**
 - **1 Arbeitstreffen von GPT 2 (Benutzung)**
 - **Automatisches Medienclearing in aDIS/BMS**



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Techn. Ausschreibung

- **Entscheidung der Verbundkonferenz die bisherige Ausschreibung aufzuheben und in ein Verhandlungsverfahren umzuleiten.**
- **Erstellung der Ausschreibungsunterlagen inkl. Aktualisierung und Präzisierung einzelner Punkte im Leistungsverzeichnis. Diese enthalten jetzt auch die Unterlagen für die vorgesehenen Tests.**
- **Aufforderung zur Abgabe eines Angebots an die drei Firmen aus der offenen Ausschreibung, die dort die formale Prüfung erfüllt hatten.**



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Techn. Ausschreibung

- **Beantwortung von Bieterfragen**
- **Verlängerung der Abgabefrist vom 3.1.2011 auf den 7.1.2011.**
- **Rüge einer Firma, die nicht zur Angebotsabgabe aufgefordert worden ist. Die führte zu einem Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer.**
- **Am 17.2.2011 entschied die Vergabekammer zu unseren Gunsten.**



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Verpackungsausschreibung

- **Vorbereitungen für die letzte Lieferung im Januar 2011**
 - **Im Dezember 2010 Liefermengenumfrage in den Bezirken durchgeführt und restliche Liefermengen bestellt**
 - **Die letzte Verpackungsauslieferung an die Bezirke erfolgte im Januar 2011**



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Bibliotheksmanagementsystem (BMS)

- Test der gelieferten Software für den RFID-Dienstarbeitsplatz und die NCIP-Schnittstelle
- Übernahme der Funktionen in das VÖBB-Produktionssystem




www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Konvertierung

- Beginn der Konvertierung: Mitte Jun. 2010

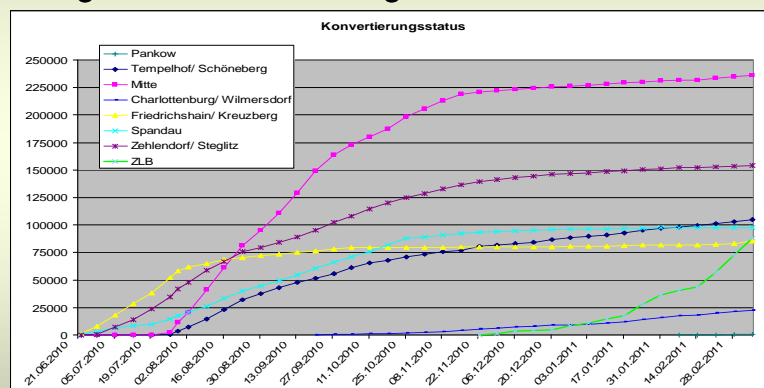


www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Konvertierung

- **Stand: 09.03.2011**

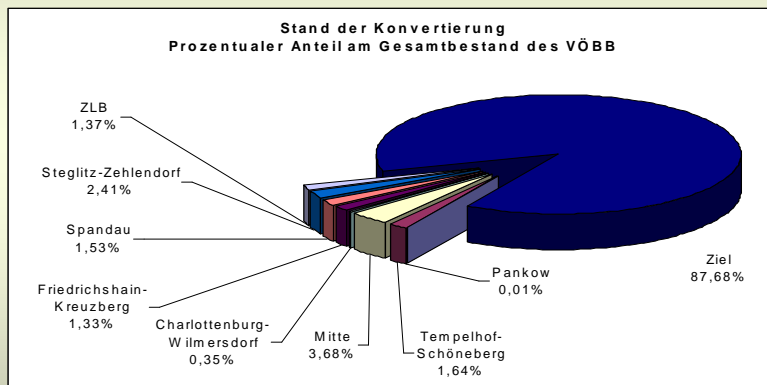

www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Schulungen

- **Schulungen Veränderungsmanagement:**
 - *Partner: Verwaltungsakademie; nicht über Projekt finanziert*
 - *Zweitägige Schulungen für die mittlere Leitungsebene: 2 Schulungen, 18. Okt. – 19. Okt. 2010; ZLB und 15. Nov. – 16. Nov. 2010; Marzahn/Hellersdorf*
 - *Eintägige Schulungen für Mitarbeiter_innen ohne Leitungsfunktion (3. Ebene): 2 Schulungen, 30. Nov. 2010 und 06. Dez. 2010 ; Marzahn/Hellersdorf*
 - *Zweitägige Schulungen für Führungskräfte, 17. -18. Jan. 2011 ; Treptow-Köpenick und 25. Jan. - 26. Jan. 2011; Lichtenberg*
 - *Eintägige Schulungen (3. Ebene): 4 Schulungen, 07. + 21. Feb. 2011 Treptow -Köpenick und 9. + 23. Febr. 2011; Lichtenberg*



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Publizitätsmaßnahmen: regelmäßige Publikationen

- **Projektwebseite: intern und öffentlich**
<http://www.bibliotheksportal.de/bibliotheken/projekte> oder
<http://rfidvoebb.bibliotheksportal.de>
- **Monatlicher Projekt-Newsletter für alle VÖBB-Teilnehmer: 4 Ausgaben von Oktober 2010 – Februar 2011**
- **TENIVER auf www.voebb.de**
- **Mailadresse rfid-im-voebb@zlb.de für Anfragen**




www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Publizitätsmaßnahmen: Zugriffsstatistik

Bibliotheksportal: Seitenaufrufe TENIVER



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Publizitätsmaßnahmen: Sonstige

- Informationen für Gremien der Berliner Öffentlichen Bibliotheken: FAK Systembetreuer, KaKo (Katalogkommission), StäKo
- 3. Wildauer Symposium am 4. und 5. Oktober 2010, Vortrag von Frau Thomas - RFID im **Verbund: Technische und Organisatorische Aspekte**
- AG RFID in Frankfurt am Main im dbv am 18.10.2010
- Gespräch mit SkzIKult am 02.11.2010



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Indikatoren

- Indikatoren:
 - *Anzahl der konvertierten Medien siehe Folie „Konvertierung“*
- Eingang des Zuwendungsbescheids am 21.12.2010



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Indikatoren / Kostenplan

- **Abweichungen vom Zeitplan:**
 - *Weiterführendes Verhandlungsverfahren benötigt ca. vier bis sechs Monate*
 - *Wieder Gefahr, dass Anbieter eine Rüge vor der Vergabekammer und anschließend eine Beschwerde vor dem Kammergericht einreichen, möglicher Zeitverzug ca. fünf bis sieben Monate*



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Sonstiges

- **Hindernisse und Probleme:**
 - *weitere Verschiebung der Zuschlagserteilung verursacht erhebliche Rechtskosten*
 - *abschließende Finanzplanung kann nicht ohne Zuschlag erfolgen*



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Ausblick

- **Weiterführung des Verhandlungsverfahren**
- **Vorbereitung einer beschränkten Ausschreibung für eine Konfliktmanagementschulung**
- **Erstellung des 3. Änderungsantrags (nach Zuschlagserteilung) zum Abschluss des Finanzplans für 2010**
- **Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung für RFID-Leseausweise (Mifare)**
- **Zusammenfassung und Auswertung der UAGs Bücher/Medienpakete und AV-Medien nach den Praxistests in den Bezirken**



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung
